GHI · 执行 · 反馈 · 交付

一张工单，怎么被执行完

工单被谁领走、在哪个目录里干、提示词怎么指挥它、进度和异常怎么回到面板、结果怎么交付与部署。

GHI.md · 配图走一遍 | DEF.md · 上一环 | ABC.md · 环境 | SOP.md · 日常

目标	给谁看	前提
看懂执行、反馈与交付	**PM 8 分钟 · Worker 看 §3–§6**	**工单已建好**

GHI

30 秒全貌

派工 → 执行 → 报告 → 交付 → 验收

① 派工
会话 + 工作目录

→

② 执行
按提示词干活

→

③ 报告
进度 / 可验收 / 受阻

→

④ 交付
PR / MinIO / 评论

→

⑤ 验收
人看结果后结束

执行器只报告

不直接改看板、不发 IM；宿主把报告落成卡片评论、移列、通知人。

结果必须有载体

代码 → PR；文档/方案 → MinIO 对象；其余 → 卡片评论。没有载体不算 ready。

卡住时不用慌：状态字典告诉你它在等什么，以及你该做什么。

术语 · 面板里就用这些词

先把六个词对齐

词	在这里的意思
执行器 Executor	真正干活的那个 Session，一个工单一个（`worker-<工单 id>`）
工作目录	这个工单专用的文件夹；名字来自工单短名 + 工单 id 前 12 位
派工 Assignment	"把这张工单交给执行器"的一次记录；重试会开新的派工
报告 Report	执行器向宿主汇报：进展、可验收、受阻、失败、无需处理
载体	结果放在哪：代码 PR / MinIO 对象 / 卡片评论
待验收	执行器说"做完了"，等人看结果、合并 PR 或确认

依赖 · 执行这一步用到的设置

各自管什么、保存后什么时候生效

设置	管什么	生效时机
执行器模型	干活用哪个模型	只对新建的执行器会话
并行工单数	同时跑几张（另有人插队名额）	之后新开的工单
执行目录 / 准备命令	工作目录建在哪、首次开工前跑什么	下一张工单
禁止的命令	按命令名拦截（护栏，不是安全边界）	立即
提示词	执行器读什么、怎么沟通、何时停、交付要求	下一次模型请求（不重启）
来源设置	看板 / 仓库 / 通知的账号与列	保存会重启；运行中的派工带恢复说明重开

工单怎么开工：五步

开工五步

1. **排队**：按并行数领活，满了就等
2. **准备目录**：首次跑准备命令（10 分钟）
3. **建会话**：`worker-<工单 id>`
4. **派工消息**：范围 + 规则 + 职责简报
5. **进认领列**：宿主把卡移到 `in-progress`

看什么算 OK

- ✓ 执行页 1 分钟内出现工单：排队中 → 执行中
- ✓ 工单页派工历史里多了一条记录
- ✓ 卡片移到了认领列


准备命令失败 = 工单失败并记录输出；空的残留目录会被删掉，重试会重跑；非空目录要先手动清理。

五层，从硬到软

层级	内容	谁改得动
1 工具与宿主硬约束	身份、权限、工具参数校验、回复用途、长度限制	改不了（代码）
2 内置 + 按设置生成	共享约定、执行器角色、订阅、回复、工作、交付与确认、执行环境、策略	提示词页（可覆写）
3 规则流程	这张工单命中的规则自带的流程与沟通要求	评估 → 规则
4 团队小节 + 技能	沟通方式 / 工单范围 / 交付要求 + 自建技能	提示词页
5 外部文本	卡片、评论、文档、引用	只是数据，不能改规矩

改提示词 ≠ 改闸门/授权：工具校验、Mandate、账号包装都在代码里。

改什么、谁读到、什么时候生效

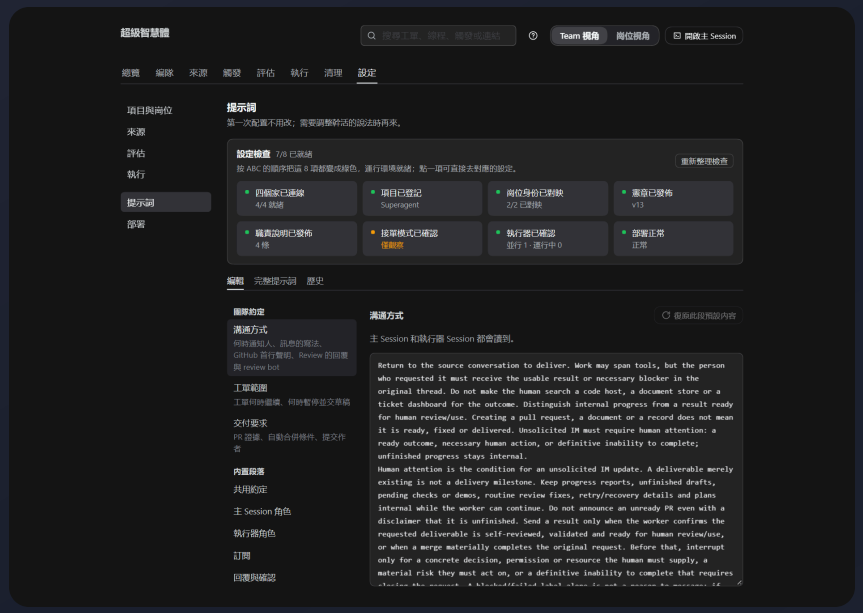

三个团队小节

- **沟通方式**：何时通知人、消息怎么写、Review 怎么回
- **工单范围**：何时继续、何时停下来交草稿
- **交付要求**：PR 证据、自动合并条件、提交作者


保存不重启；下一次模型请求就用新文本。内置段落可覆写；升级后默认变了会标「默认内容已更新」。

派工说明、宪章、仓库说明

还会读

- **派工说明**：范围 + 职责简报；截断处按 `ticket/…` 读全文
- **宪章**：开工第一步读，报版本与载体
- **仓库 AGENTS.md** 与仓库要求的检查

人的消息直达工单；超范围就交还（handback），不自己扩大授权。

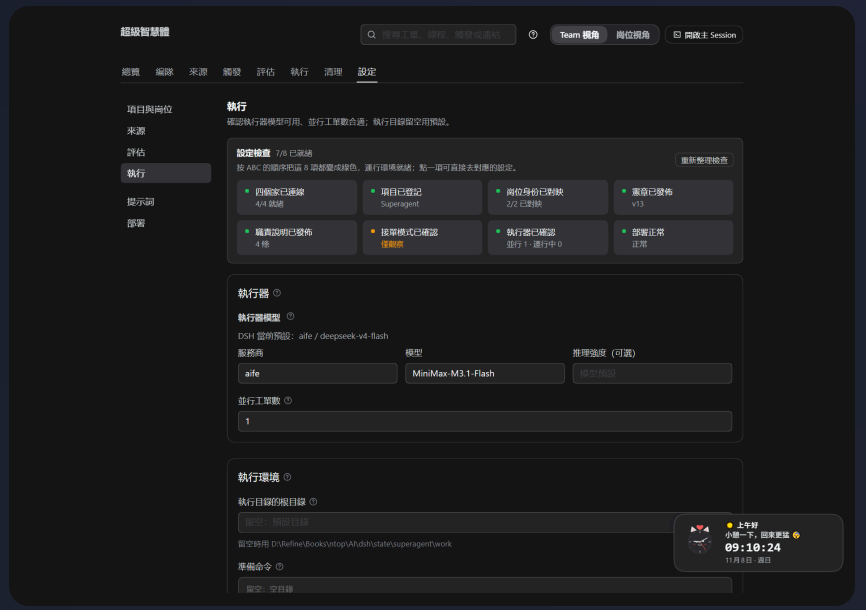

读 → 定 → 做

01

读

宪章 → 职责简报 → 卡片/线程 → 仓库说明；拿不准按范围小的一边做。

02

定方案

自己决定做法；要产品/设计决定的，停下来报告而不是猜。

03

做

在工作目录里改文件、跑命令；长命令转后台，不堵消息。

原则

范围小的一边做；要产品/设计决定就停下来，不猜。

H3 · 干活（下）

查 → 交

04 查

跑仓库要求的检查，自己审一遍

05 交

放进载体、回读确认、再报告

长命令

自动转后台任务；结束后会唤醒它，不堵消息。

范围

人发的消息直达工单；超范围就交还（handback），不自己扩大授权。

五种报告，一眼看出它在等你什么

报告	含义	面板上	卡片/消息
progress	还在干、阶段性进展	执行中	内部；答人问题时会带出去
ready	可验收（有 PR = 待验收；无 PR = 完成）	待验收	结果写回评论
blocked	缺前置、要人处理	待处理受阻	写清卡点
failed	执行失败	待处理失败	记录错误；网络类先自动重试 3 次
dropped	没什么要做的	已结束（无需处理）	静默；后续消息可恢复

执行器只报告，宿主写评论、移列（认领列 → 交付列）、通知人。

进度回到哪里




工单页能看到

- 状态与可做的操作
- **授权详情**：强度、发起人、决定、规则、范围、政策版本
- **未送达的输入**与**订阅的线程**
- **派工历史**：几次派工、时间与报告

编队页看每个岗位的「在飞职责 / WIP」；执行页按状态筛选。

未送达的输入、订阅的线程、派工历史

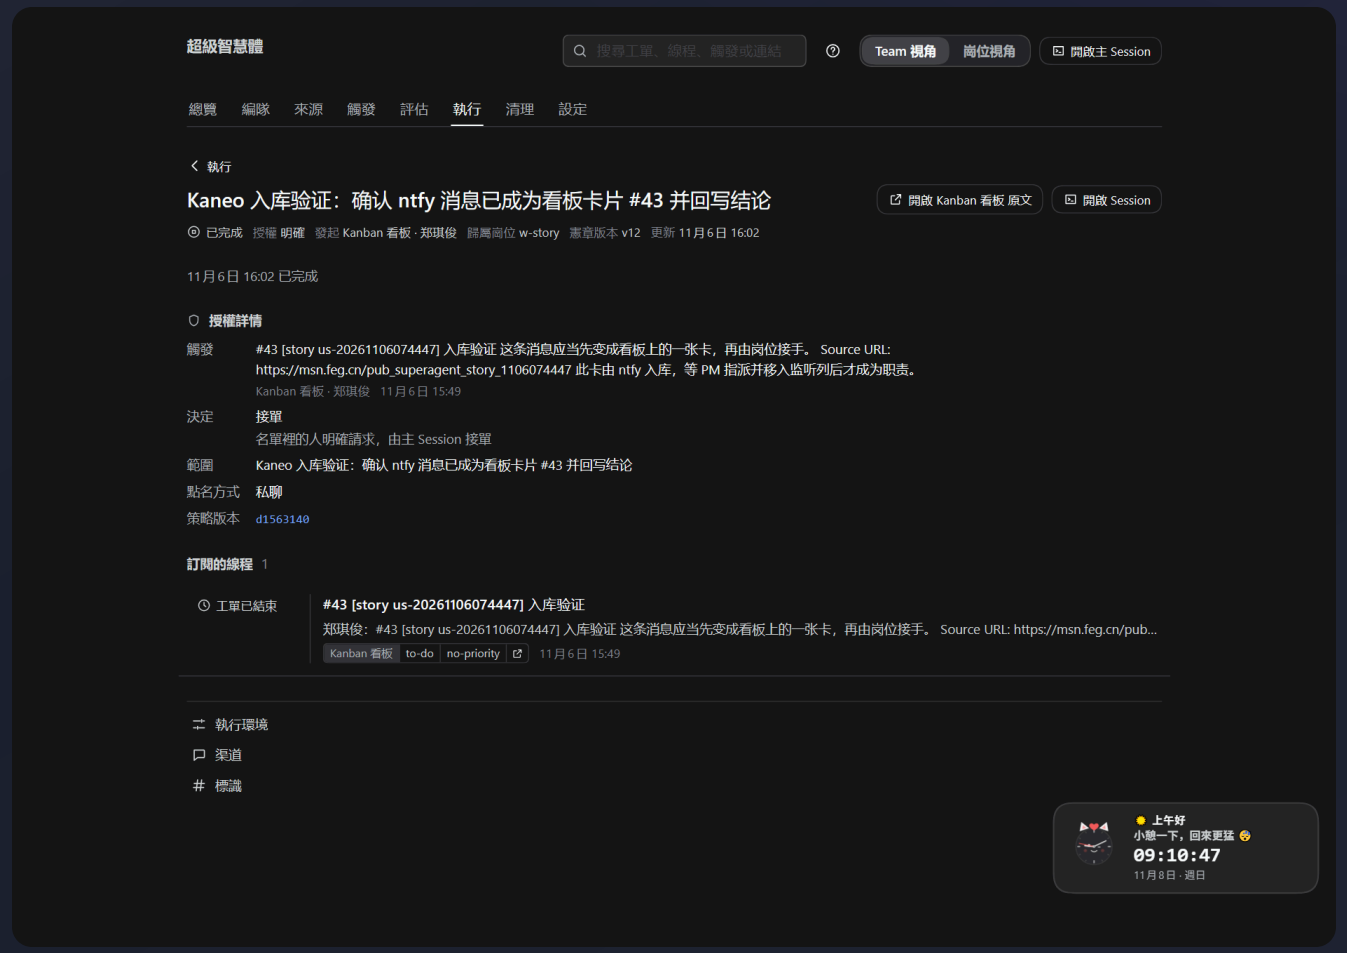

卡住了怎么办：先看状态，再对号入座

你看到的	含义	你做什么
排队中	等并行名额	正常等；想快就调大并行数
待回答	它提了一个具体问题	在卡片/线程回答
待验收	做完了等人看	看结果/PR；合并或确认
待处理受阻	缺前置（权限/凭据/信息）	补上后回消息，或点重试
待处理失败	启动/执行出错	修好后重试（同会话/目录/PR 继续）
输入未送达	消息没送到执行器	自动重试；仍失败可重试
等待新触发	这轮干完，没等人	线程新消息会唤醒
已结束	完成/合并/关闭/停止/无需处理	看结果；按需清理

暂停、停止、重试、接手

暂停处理

不派新工单、不评估、不回复；正在跑的回合不打断。人发的消息等恢复。

停止工单

结束当前派工，**保留**会话与工作目录；收回授权，之后线程消息不自动恢复。

重试

同一会话、目录、分支、PR 继续；失败/受阻/输入未送达时可用。

重启/升级

运行中的派工中断后带"检查目录、git 历史、PR 再继续"重开；其余状态保持。

H6 • 交付

结果放在哪：载体由产出类型决定

产出类型	载体	回写
`kind:code`	代码 PR；`repo:owner/name` 说明动哪个仓库	PR 链接 + 评审状态
`doc` / `plan` / `memo` / `log`	MinIO 对象：`deliverables/<项目>/<工单>/<文件>`，写完回读	`bucket/key` + 一句摘要
其他（报价、合同、投诉、物流回执…）	卡片评论（追加式）	结论 + 状态推进

卡片评论只写进度与结果，正文/文件放载体；同一 key 覆盖即修订，不撒版本。

什么算"交付完成"

有 PR

ready = **待验收**；PR 合并/关闭后工单才结束，并记结果（完成/合并/关闭）。

没有 PR

ready 直接结束为**已完成**；什么都不用做时 dropped 静默结束。


半成品


blocked，并写清草稿在哪、还差什么——**不算 ready**。

UI 变更

PR 描述要有 **Before 和 After** 两张证据；只有 After 不算完成。

宿主这一侧：状态目录、部署检查、收尾

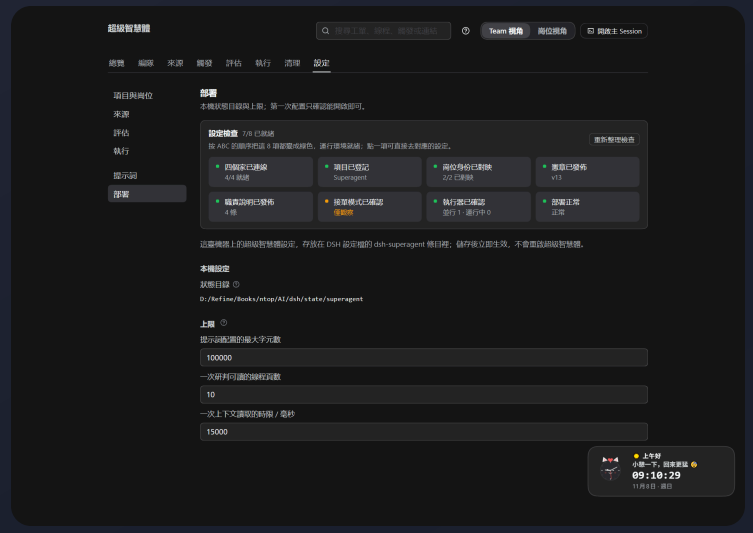

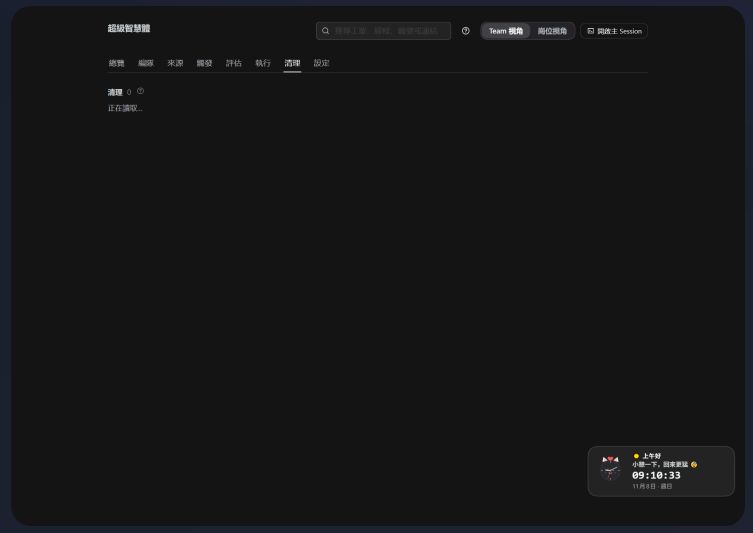

部署页：状态目录（工件、会话、设置都在这里）与部署检查。清理页：列出已结束职责的残留；默认只解除登记，可分别勾选删目录、清 Session；三项残留清完后行会消失。

演练 · 约 5 分钟

用一张低风险卡走完整闭环

时刻	你应该看到
T+0	建卡（负责人 = Worker 岗位、`duty:doc`）并拖进监听列
T+0 ~ 1 分钟	触发 → 决定 → 工单（DEF 的流程）
T+1 ~ 5 分钟	执行页：排队中 → 执行中；卡片进认领列
完成时	报告 ready/blocked/failed；评论里有 `bucket/key` 或结论；卡片进交付列
之后	MinIO 里能回读文件；清理页看到该工单的工作区

想看异常：在卡上留一句"需要更多信息"，会看到待回答；补上后再看它继续。

常见 · 按现象找

执行阶段最容易撞到的几个

现象	多半原因	怎么办
一直排队	并行数满 / 暂停 / 模型不可用	看"执行中 x/y"；调并行数或恢复
一直执行中没动静	长命令在后台 / 模型慢 / 准备命令卡住	看派工历史与 Session；准备命令 10 分钟失败
准备命令失败	目录、权限、git 克隆失败	工单页有输出；修好后重试
消息没反应	工单已结束 / 暂停 / 输入未送达	看状态；已结束的线程会重新评估或恢复
交付物找不到	只写了本地路径 / key 错	载体必须是 `bucket/key`，回读后再报告
PR 没合并、工单没结束	待验收，等人合并	合并/关闭 PR，或配置自动合并

GHI · 一句话

领走 → 按提示词干 → 报告 → 交付 → 验收

结果放进 PR / MinIO / 评论；卡住按状态对号入座；交付完再清理工作区。

上一环：需求怎么变成工单——见 DEF。

GHI.md · 完整说明 | DEF.md · 上一环 | ABC.md · 环境 | SOP.md · 日常
