EA · 能力供给 · 落地路线

宪章仓库，团队的能力生产线

不只写规则，还要持续供给能力：复盘长出认知，上下文统一认知，知识固化成资产，技能变成可复用的能力，宪章约束下一轮。
这是一份给 PM 与项目负责人的落地设计，不是文档清单。

理念 + 落地 | 五层资产 | PM 四条职责 | 12 周路线

受众
PM / 项目负责人

证据
PR #1 • 演练 #45/#46

边界
12 周目标是愿景，不是现状

EA

不是文档仓库，是能力供给系统

NOT

不只是

- ✕ 规则文件（README + 职责说明）
- ✕ Wiki、文档堆、收藏夹
- ✕ PM 的作业本

BUT

而是

- ✓ 让"团队怎么干活"从个人经验变成**可追溯、可复用、可进化**的资产
- ✓ 复盘 → 上下文 → 知识 → 技能 → 宪章，**一条持续转动的生产线**
- ✓ PM 的职责从"发宪章、派工"扩展到**经营这套资产**

判断标准只有一条：**这些资产有没有让下一轮工作更快、更少返工、更容易复制。**没有用的，删掉。

WHY · 为什么现在做

单薄的代价，最后都由交付和新人买单

今天的现象	真实代价	EA 的对策
经验留在人脑和聊天记录	同一个坑反复踩；人一走就断档	复盘与 KE：结论进仓库、有来源、可检索
PM 只发宪章、派工、处理异常	没人对"能力供给"负责，库建了也会荒	PM 四条运营职责 + 固定节奏
知识和规则混在一起	规则被稀释，知识找不到	五层资产分层：规则、职责、节奏、上下文、知识、技能
技能靠个人摸索	能力不可复制、不可审计	技能库：提取→迭代→测试→发布→退役

一句话：不是"再加几个文件夹"，而是给 PM 一套可执行的运营职责 + 一套有质量门槛的资产结构。

DESIGN PRINCIPLES

五条原则，保证"建了有人用"

01

少而准

一条只讲一件事；不合格就不收（KE 的 MAKE、技能的测试门槛）。

02

可追溯

每条资产能指回卡片/工单/复盘；原始记录不复制进仓库。

03

有 Owner

每层有负责人与节奏；没有 Owner 的资产不算落地。

04

有门槛

复盘有数据、知识过 MAKE、技能有测试，才允许"生效/发布"。

05

没人用就删

月度复盘做资产清理；收藏夹式堆积等于没建。

06

分层不越级

知识从复盘来、技能从知识/职责来、职责引用宪章；下层不绕过上层。

THE MAP · 手里有图

六层资产，每层只回答一个问题

L0 契约

按什么规则协作？ README + CAPABILITY

L1 职责

谁接、怎么干、干到哪算完？ duties/

L2 节奏

干得怎么样、下一轮改什么？ reviews/

L3 上下文

团队现在共同知道什么？ context/

L4 知识

哪些值得留下、放哪、怎么找？ KE/

L5 技能

哪些能力被验证过、哪个版本？ skills/

三条约束：资产必须可追溯到卡片/复盘；下层引用上层；**没人用的资产定期清理。**

输入 → 复盘 → 上下文 → 知识 → 技能 → 供给

输入
卡 / 评论 / PR / 异常

→

复盘
日 / 周 / 月

→

上下文
最新总结 / 对象 / 本体

→

知识
KE · MAKE

→

技能
测试后才发布

→

供给
宪章 / 职责

供给什么

下一轮的规则、职责、上下文、知识与可复用技能——**让同样的坑只踩一次。**

凭什么说它有效

看指标：复盘按时率、上下文新鲜度、知识复用、技能发布、返工率（见后文）。

规则要少，职责要能派工

L0 契约

- **README**：流程、岗位、交付标准、沟通、复盘（每周最多一版）
- **CAPABILITY**：资产清单、Owner、节奏、质量门槛、能力地图

✓ 规则只写"必须"和"怎么验收"，不写口号

L1 职责（PM 新增 4 条）

- `pm-charter-steward`：宪章与能力供给
- `pm-retro-curator`：复盘与公共上下文
- `pm-context-curator`：领域对象与组织本体
- `pm-knowledge-curator`：知识库与技能库

每条都有目标、输入、载体、完成定义；不是"有空做做"。

复盘不是汇报，是检查生产线

频率	回答	主要输入	产出
日 10 分钟	今天卡在哪、明天先干什么	当日触发/工单/异常	行动项（Owner+期限）
周 30 分钟	哪些做法有效、哪些要改	日复盘 + 指标 + 典型工单	≤3 条改进、更新上下文、知识候选
月 60 分钟	能力与路线是否还成立	周复盘 + 趋势 + 资产库存	下月路线、能力缺口、资产清理

质量门槛：有数据、有 ≤3 条可执行改进、有 Owner 与期限、24 小时内更新 `context/retrospectives.md`。

团队现在共同知道什么

A

最新复盘总结

`retrospectives.md`：最新结论、指标、未关闭行动项；**≤7 天。**

B

领域对象

`domain/`：定义、属性、关系、规则、证据、**有效期。**

C

组织本体

`ontology/`：组织→岗位→职责→能力→价值流→对象，六层并每月对齐。

原则：context 是"当前认知的最短版本"，长文进 KE，原文链接回卡片/工单。

P/A/R/T 决定放哪，MAKE 决定收不收

四层

- **P** **Project**：有起止的项目知识（决策/里程碑/教训）
- **A** **Area**：长期领域的规范/口径/流程
- **R** **Reference**：外部资料摘要与索引
- **T** **Task**：一次性问题的解法/命令

MAKE 四性

- **M** **Minimal**：一条只讲一件事
- **A** **Actionable**：能直接照做
- **K** **Knowledge**：解释为什么
- **E** **Experience**：来自真实场景，有来源与代价

缺 Actionable 或 Experience 的退回；季度复核，过期归档。

能力要能被验证和复用

状态	含义	进入条件	退出条件
draft	提取中的草稿	有真实使用场景	有测试用例
testing	真实工单中试用	至少 1 次真实使用	通过验收用例
published	可被岗位引用	版本 + Owner + 测试证据	被替代或失效
deprecated	退役	新版替代/场景消失	归档保留链接


发布门槛：`SKILL.md` 完整 + 验收用例 + 版本 + Owner + `registry.md` 登记。**没有测试只能算 draft。**

PM 的四条运营职责（可派工、可验收）

职责	频次	完成定义（摘要）
pm-charter-steward	每周	README 版本 +1 且与面板同文；PR 含变更理由/影响/验收/回滚；健康检查无红项
pm-retro-curator	日/周/月	review 落库；≤3 条改进有 Owner+期限；24h 内更新最新复盘总结
pm-context-curator	每周/月	新增/更新 ≥1 个对象或本体节点；有证据与有效期；索引同步
pm-knowledge-curator	每周	KE ≥1 条过 MAKE 并登记；技能至少推进一个状态

喂料顺序：**retro → context → KE → skills → 宪章**。PM 不是写文档的人，是让资产流动的人。

这套方法长在已经跑通的流水线上

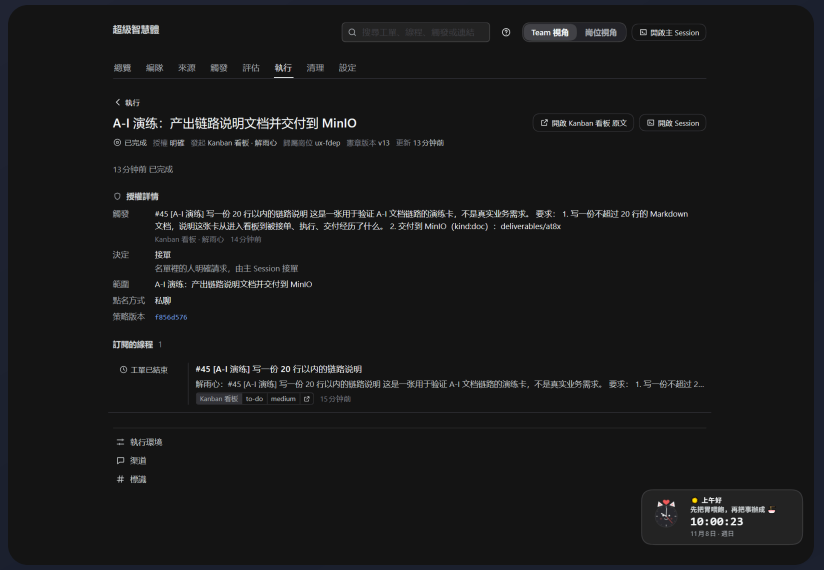

已发生的事实

- ✓ 演练卡 #45：建卡 → 接单 → 工单 → MinIO 交付 → done，**1 分 48 秒**
- ✓ 对照实验 #46：标签先挂 → 工单带「产出类型：文档」
- ✓ 数据可复核：卡 #45/#46 仍在看板，MinIO 对象可回读

来源：A-I.md §11（含截图与时间）。

EVIDENCE · 已先落一版骨架

理念有载体，不是空计划

已交付	内容	验证
宪章仓库 PR #1	28 个文件：README v14 · CAPABILITY · reviews/ · context/ · KE/ · skills/ · 4 条 PM 职责	PR open，28 files
PM 职责	4 条 `duty:pm-*`，按 folder 模式编写	解析测试 4/4 通过
模板与索引	复盘三模板、对象卡模板、KE 模板、技能模板、索引/登记表	目录契约齐全

诚实边界：这些是"骨架已就位"，**还没合并、还没发布、还没跑第一次复盘**——下一节就是路。

ROADMAP · 脚下有路

P0 骨架 + 四个阶段，每阶段有验收与回滚

阶段	周期	做到什么	怎么验收
P0 骨架	本周	目录/模板/4 条职责 + 宪章 v14	解析通过；PM 能派 1 张 pm 卡
P1 复盘跑通	2–3 周	日/周复盘 + 最新总结	连续 2 周日 ≥80%；周 100%
P2 上下文成形	4–6 周	3 个对象卡 + 1 版本体	有来源/有效期；与职责一致
P3 知识+技能	7–10 周	KE 6 条 + 1–2 技能发布	索引可检索；技能有测试
P4 经营化	11–12 周	指标运行、能力地图版本化	5 指标连续 4 周达标

每阶段结束做 15 分钟复盘：哪些资产真的被用了？没人用的删掉。

FIRST WEEK · PM 的落地第一周

五张卡，跑出第一批真实资产

时间	动作	产出
周一	读 EA + 宪章；注册/确认 PM 岗位，选中 4 条职责	岗位与职责映射
周二	派 `pm-retro-curator` 卡，跑第一次周复盘	`reviews/weekly/` + 最新总结更新
周三	派 `pm-knowledge-curator` 卡，提炼 3 条 KE	`KE/` 条目 + 索引
周四	派 `pm-context-curator` 卡，写 1 个对象 + 本体草案	`context/domain` + `ontology`
周五	派 `pm-charter-steward` 卡，宪章改版 + 15 分钟复盘	README v15 + 复盘记录

验收：4 张 PM 卡全部 done，评论里有 PR 链接；仓库有对应文件；最新总结指向本周复盘。

METRICS · 言之有理

一个北极星 + 五个先行指标

指标	定义	12 周目标
能力复用率（北极星）	被 ≥2 张不同卡片/复盘引用的生效资产 ÷ 生效资产总数	≥0.5
复盘按时率	按时完成的日/周复盘 ÷ 应完成数	日 ≥80%，周 100%
上下文新鲜度	最新复盘 ≤7 天且指针正确	100%
KE 合格率	过 MAKE 的生效条目 ÷ 总条目	≥80%；累计 ≥10
技能发布数	published 状态技能数	≥2（含测试）
返工率	缺上下文/知识导致的返工 ÷ 总工单（P0 末为基线）	相对基线下降 ≥30%

CURRENT STATE · 诚实区分

已落地 / 待决策 / 愿景

状态	事实	证据
已落地	A-I 流水线可运行（1 分 48 秒闭环）；宪章仓库 PR #1（28 文件）；4 条 PM 职责解析通过	A-I §11；PR #1；解析测试
待决策	PR 合并；面板发布 README v14；注册 PM 岗位；第一次周复盘	EA §10/§14
愿景（12 周）	KE ≥10、技能 ≥2 published、本体 v1、5 指标连续 4 周达标	EA §11–§12（目标）

不把"目标"说成"现状"；不把"骨架"说成"运行"。

RISKS · 边界与对策

最可能失败的五种方式

风险	对策
形式主义：建了没人用	月度清理；复盘必须产出行动项；没用的资产删掉
PM 负荷过重	先跑 retro + knowledge 两条；日复盘 10 分钟封顶；数据整理可分给 Worker
与面板/卡片重复	README 以面板发布为准；仓库只放提炼资产，原文链接回卡
知识质量差	MAKE 门槛 + 查重 + 季度复核；不合格拒收并写理由
技能不可信	发布必须有测试证据与版本；draft/testing 不得被引用

EA · 收尾

手里有图，心里有谱，脚下有路，言之有理

六层资产是图；PM 四条职责与指标是谱；P0–P4 与第一周 runbook 是路；演练数据、PR #1 与解析测试是理。下一步只有四件事：合并 PR、发布宪章、注册 PM、跑第一次复盘。

EA.md · 完整设计 | PR #1 · 骨架 | A-I.md · 运行证据 | ABC.md · 环境
