INDEX · 8 份 PDF · 151 页

先看 A-I 前三页，再按目标选一条路

三条路

1. **第一次跑通**：A-I → ABC → DEF → GHI（约 2 小时）
2. **搭宪章 / 能力体系**：EA → ABC → A-I（约 1.5 小时）
3. **理解设计 / 对外讲**：AIOS → STORY → A-I → EA（约 2 小时）
4. **日常手册**：SOP；细节回查 ABC / DEF / GHI

按问题找：环境→ABC · 卡没接→DEF · 卡住→GHI · 复盘/知识→EA · 每天怎么干→SOP · 讲给别人→STORY。
第 2–5 页是 2026-11-08 真跑的一次最小迭代（PM 入册 → 派单 → Worker 交付 → 复盘）。

#	文件	用途	页
①	A-I.pdf	九节完整流水线 + 真实演练（先看）	22
②	ABC.pdf	把运行环境准备好（+ 建卡 4 条）	16
③	DEF.pdf	需求怎么变成工单	16
④	GHI.pdf	工单怎么执行、反馈与交付	21
⑤	EA.pdf	宪章仓库 = 能力供给系统	20
⑥	AIOS.pdf	为什么这样设计	18
⑦	SOP.pdf	日常操作手册	22
⑧	STORY.pdf	用户故事：小吴的一天	16

PDF 由同名 `.md` / `.html` 生成；新增或删除 PDF 时同步 `INDEX.md` 与本页。

实测 · 场景设定（2026-11-08）

项目 id + 宪章仓库之后：配 4 个源，设 PM / Worker 两种角色


4 个源（设置 → 来源）

源	必填	本次
Kanban	服务器 / API key / 项目	pl.feg.cn · 项目 id · 监听 to-do
Gitea	服务器 / 仓库 / 宪章文件	git.feg.cn · shawoo/rsi_superagent · README.md
ntfy	服务器 / 主题	msn.feg.cn · pub_<项目 id>
MinIO	地址 / 桶 / 密钥	桶 ateam（密钥读本机存储记录）

Team 两种角色（设置 → 项目与岗位）

角色	岗位	关键字段
PM	pm-rsi	WIP 2 · 5 条 pm-* 职责 · 监听 to-do
Worker	ux-fdep / api-fdep	WIP 3 · ui+rehearsal / api

PM 初始化：宪章 v14 + 职责 10 条（新增 rehearsal→ux-fdep）+ PM 入册；4 源 4/4 ready，岗位身份 3/3 已映射。





实测 · 时间线（+08:00）

一次被闸门拦下、修复、再接单的迭代

时刻	动作	结果 / 证据
16:45:11	PM 发布宪章 v14、职责 10 条	Worker 开工读到的版本即 v14
16:47:31	建卡 #47（先放 in-review，不触发）	卡号 #47
16:47:54–56	挂 duty:rehearsal + kind:doc，再移入 to-do	标签先挂、最后进监听列
16:48:48	**第一次决定：忽略（dutyUnsupported）**	闸门真实拦截：ux-fdep 职责下拉只有 ui，没接 rehearsal
16:49:31	主 Session 把拒绝原因写回卡/线程	“待 PM 把卡改派给承担该职责的岗位”
~17:02	PM 修正岗位–职责映射并 requeue	人工 13 分钟，正是复盘要改进的点
17:03:20	决定：**接单**（explicitRouted）	触发被重新受理
17:03:25	派工给 ux-fdep，worker 会话开工	读宪章 v14 + duty brief
17:05:36	写 MinIO deliverables/…/iteration.md	1928 字节，已回读
17:06:13	报告 ready → 工单 completed	执行耗时 **2 分 53 秒**
17:06:23	卡片评论回写 bucket/key 与结论	卡进入 done

复盘结论：闸门拦住错误映射、没有乱建单；requeue 后一次通过。**唯一人工卡点是 PM 初始化漏了岗位–职责映射**，已列为第一条改进。


实测 · 证据

2 分 53 秒交付、18 分 42 秒闭环；一条真实闸门拦截

指标	值
决策	2 次忽略（dutyUnsupported / 说明）+ 1 次接单（explicitRouted）
工单 / 卡片	0c83ceb9…，归属 ux-fdep，completed；卡 #47 done，2 条评论含 bucket/key
耗时	执行 2 分 53 秒；端到端 18 分 42 秒（含人工修映射与 requeue）
交付物	ateam/…/iteration.md，1928 B，minio_read 回读一致
闸门	命中 1 次真实拦截（岗位未承接职责），修映射后放行





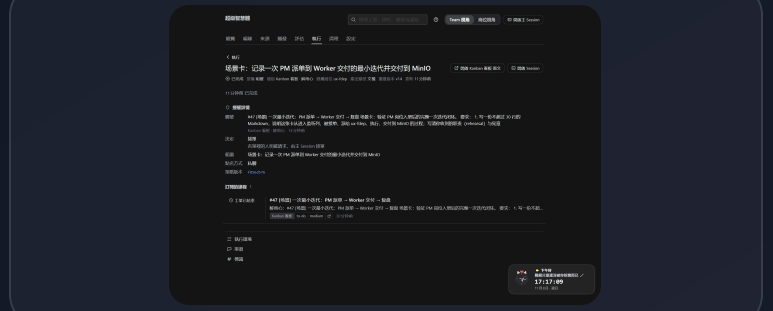

方法、结论与改进项：自动化路径已验证可接

手动复盘：怎么做的

方法：面板 API 取 threads / decisions / tickets 时间线 → MinIO 回读交付物 → Kaneo 取卡片状态与评论 → 按 EA 复盘门槛写结论（有数据、≤3 条改进、Owner+期限）。

做得好：闸门拦住错误映射、没有乱建单；requeue 后一次通过；worker 自读宪章 v14 并回读交付物。

问题：PM 初始化漏了“岗位–职责映射核对”，首次被闸门拒绝。

结论：一次完整闭环成立；唯一人工卡点是初始化映射，已作为第一条复盘改进。

改进（≤3，Owner / 期限）与自动化

① PM 初始化清单加“岗位–职责映射核对” —— PM，本周

② 建卡前先对照 duty:<id> 与目标岗位职责自检 —— PM，立即

③ 复盘定时化：cron → ntfy → 卡 → pm-retro-curator —— PM，P1

自动化未启用：Windows 任务计划/CI 定时向 ntfy（tag dsh）发日/周/月复盘；ntfy 来源入库成卡，若 PM 映射宿主账号则直接进 PM 队列。详见 PM.md §4。

复现：scripts/capture-scenario-shots.mjs；卡 #47、工单 0c83ceb9…、宪章 v14 均保留可查。
